


**APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.171 CELLETTE
OSSARIO PREFABBRICATE PER IL CIMITERO DI CRENNNA**

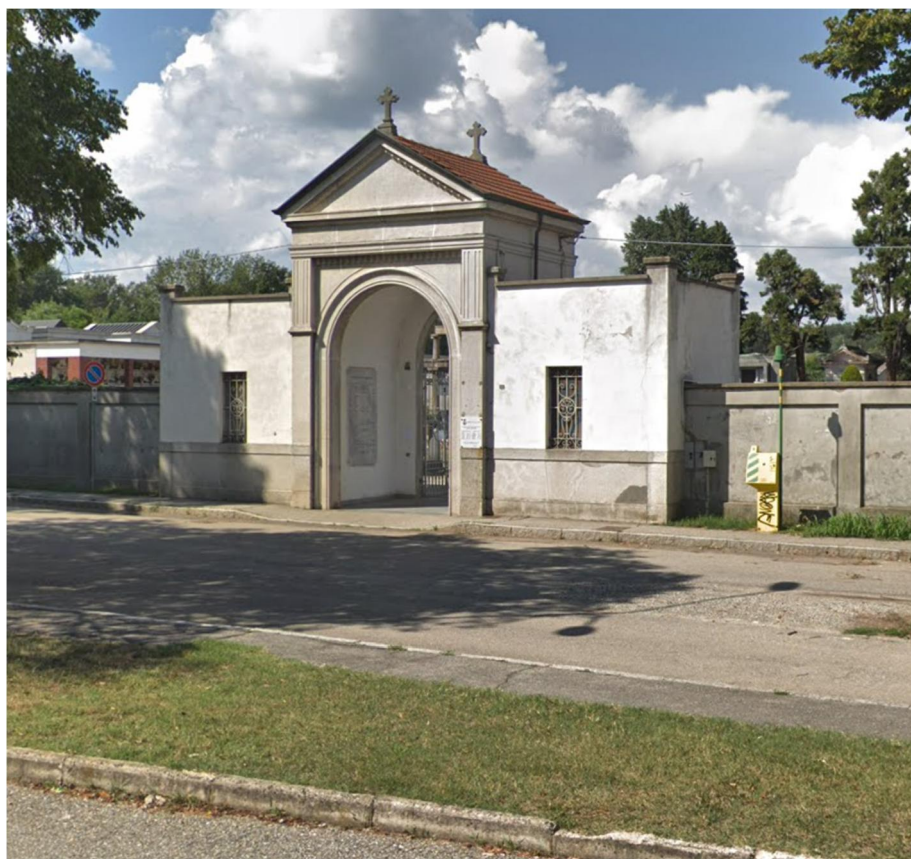

RELAZIONE TECNICA

IL tecnico

Arch.Cristiano Papaleo

RELAZIONE GENERALE

1. FINALITA', RAPPORTO COSTI BENEFICI

Premesso che:

Questa Amministrazione Comunale, attualmente non dispone di cellette ossario utilizzabili.

La costruzione di blocchi prefabbricati di cellette ossario consente l'ottimizzazione degli spazi a disposizione.

La finalità di questo intervento è garantire una offerta di sistemazione delle ceneri nell'ambito del sedime cimiteriale di Crenna.

L'adeguamento prospettato in termini tecnici-economici, meglio indicati negli allegati di progetto, soddisfa il rapporto costi-benefici.

2. CRITERI PROGETTUALI, INSERIMENTO SUL TERRITORIO, CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI, ECONOMIA DI GESTIONE, MOTIVAZIONI SULLE SCELTE ARCHITETTONICHE E IMPIANTISTICHE

I criteri progettuali adottati seguono di pari passo i presupposti dell'intervento pianificato: economicità realizzativa e gestionale, razionalità nell'utilizzo degli spazi, flessibilità, soddisfacimento dei requisiti.

Il progetto prevede la realizzazione di un totale di n. 171 cellette ossario prefabbricate in metallo.

Gli ossari verranno posizionati nel cimitero di Crenna in tre aree differenti, indicate come Area1, Area 2 e Area 3, nello specifico verranno collocati in appoggio alle due pareti laterali dei loculi esistenti che si trovano al piano seminterrato ed al piano rialzato in zona nord del cimitero, nei disegni queste zone sono identificate come Area 1 e Area 2, dove verranno realizzati 54 ossari al piano interrato (Area 1) e 63 ossari al piano rialzato (Area 2), gli altri 54 ossari verranno posizionati in appoggio al muro esistente, in zona identificata nei disegni come Area 3 ad ovest nel cimitero, arrivando ad un totale di 171 ossari.

Per poter fare questo intervento sarà necessario, in Area 3 ad ovest nel cimitero, chiudere la parte terminale del muro perimetrale del cimitero, con blocchi di calcestruzzo faccia a vista e dopo il posizionamento degli ossari chiudere l'apertura al di sopra di essi con cartongesso resistente all'umidità, fino ad arrivare alla copertura.

Gli interventi da effettuare in Area 1 e Area 2 saranno lo spostamento di due prese elettriche, una posta al piano seminterrato ed una posta al piano rialzato, inoltre la rimozione dello zoccolino esistente per la parte dove saranno collocati gli ossari.

Gli spazi di nuova progettazione mantengono tutte le caratteristiche in termini di gestione del rapporto ente-cittadino non andando a interferire in alcun modo con l'esistente.

Nel progetto a livello tecnico sono stati individuati prodotti aventi caratteristiche prestazionali elevate e che soddisfano i più rigidi requisiti, sia normativi che di economia di gestione e manutenzione.

La progettazione di questo intervento è stata caratterizzata da un'impronta al riuso funzionale degli spazi a disposizione, in un'ottica prevalentemente protesa all'ottimizzazione delle funzioni e all'adeguamento strutturale, per quanto possibile in termini economici e tempistici.

La struttura degli ossari sarà del tipo autoportante in metallo ed elementi contenitivi adatti all'accoglimento di cassette resti ed urne cinerarie e dovrà avere rivestimento in marmo bianco Carrara dello spessore di 2cm per quel che concerne gli ossari e Serizzo per le parti di coronamento, contorni e per le spalle.

Infine ci saranno le borchie in ottone in numero necessario e sufficiente per il fissaggio dei marmi.

IL TECNICO


Arch. Cristiano Papaleo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Luca Picco

RILIEVO FOTOGRAFICO

Crenna

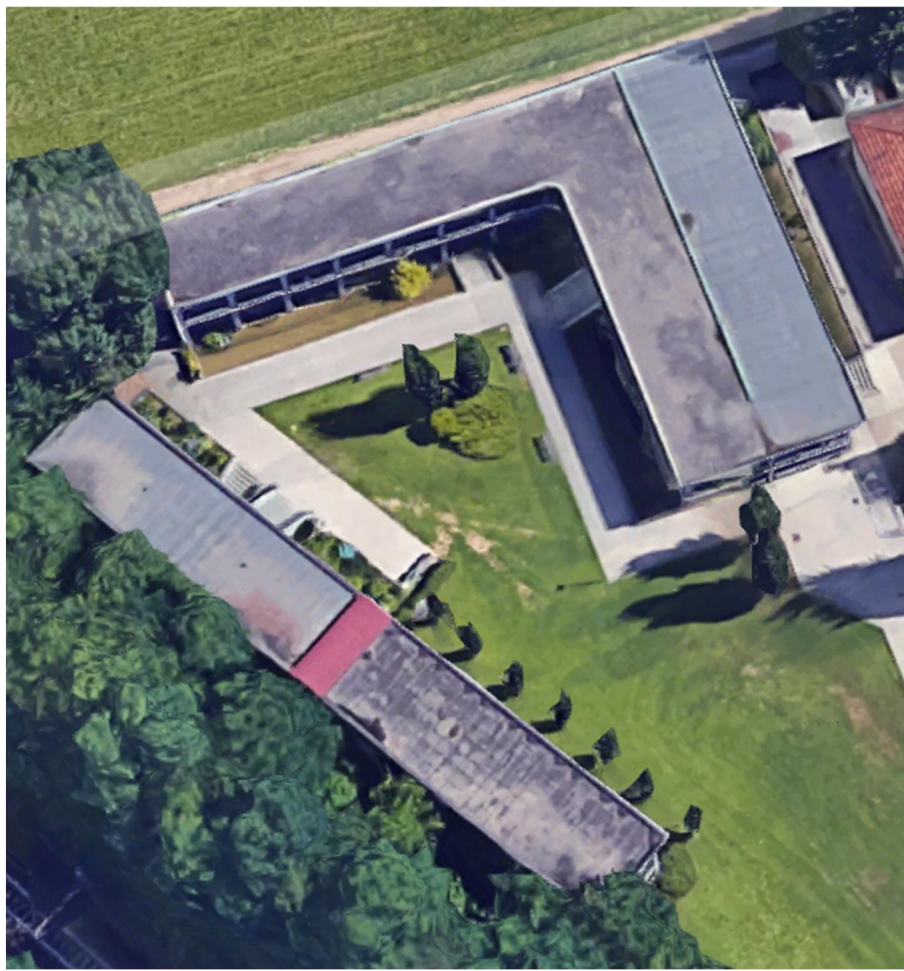

AREA 1 SEMINTERRATO



AREA2 PIANO RIALZATO



AREA 3 PIANO RIALZATO

